

■ 工事工程表 (参考) 県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事

年		令和3年		令和4年				
工事種別	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
仮設工事 ※外部足場			現地調査・準備工 21	足場設置 21	車路足場設置 (3F~4F) 3	足場解体 3	足場解体前検査 14	完了検査
				車路足場設置 (1F~3F) 3	足場解体 3			
既存耐震庫 長寿命化工事			車路20-7°外壁改修工事 (3F~4F) 14	防水改修工事 (4F) 21	車路20-7°外壁改修工事 (1F~3F) 21	防水改修工事 (3F) 14	防水改修工事 (2Fヨット搬入口) 14	東側庇 (軒天) 21
							外部階段改修工事 14	
建築物工事								
備 考				閉館期間 12/29~1/3 12/6~12/28 4F駐車場使用不可 ↳ 教習々3Fへ	1/4~1/31 3F駐車場使用不可 ↓ 別添駐車場240-2へ			

既存耐震庫 長寿命化工事

※ざっと足場が設置されている

174-0322 2Fヨット搬入口


174-0322 2Fヨット搬入口
1D770 程度

駐車場の入口で、
両壁に足場設置のため
片側通行になる。
剋復先？
出る車は確認の上！

外置は
工事車輛専用
+ 3階月極契約車両
のみ OK!


床面 2.5m 開口部あり
2.5m 開口部あり
OK!

仮設計図

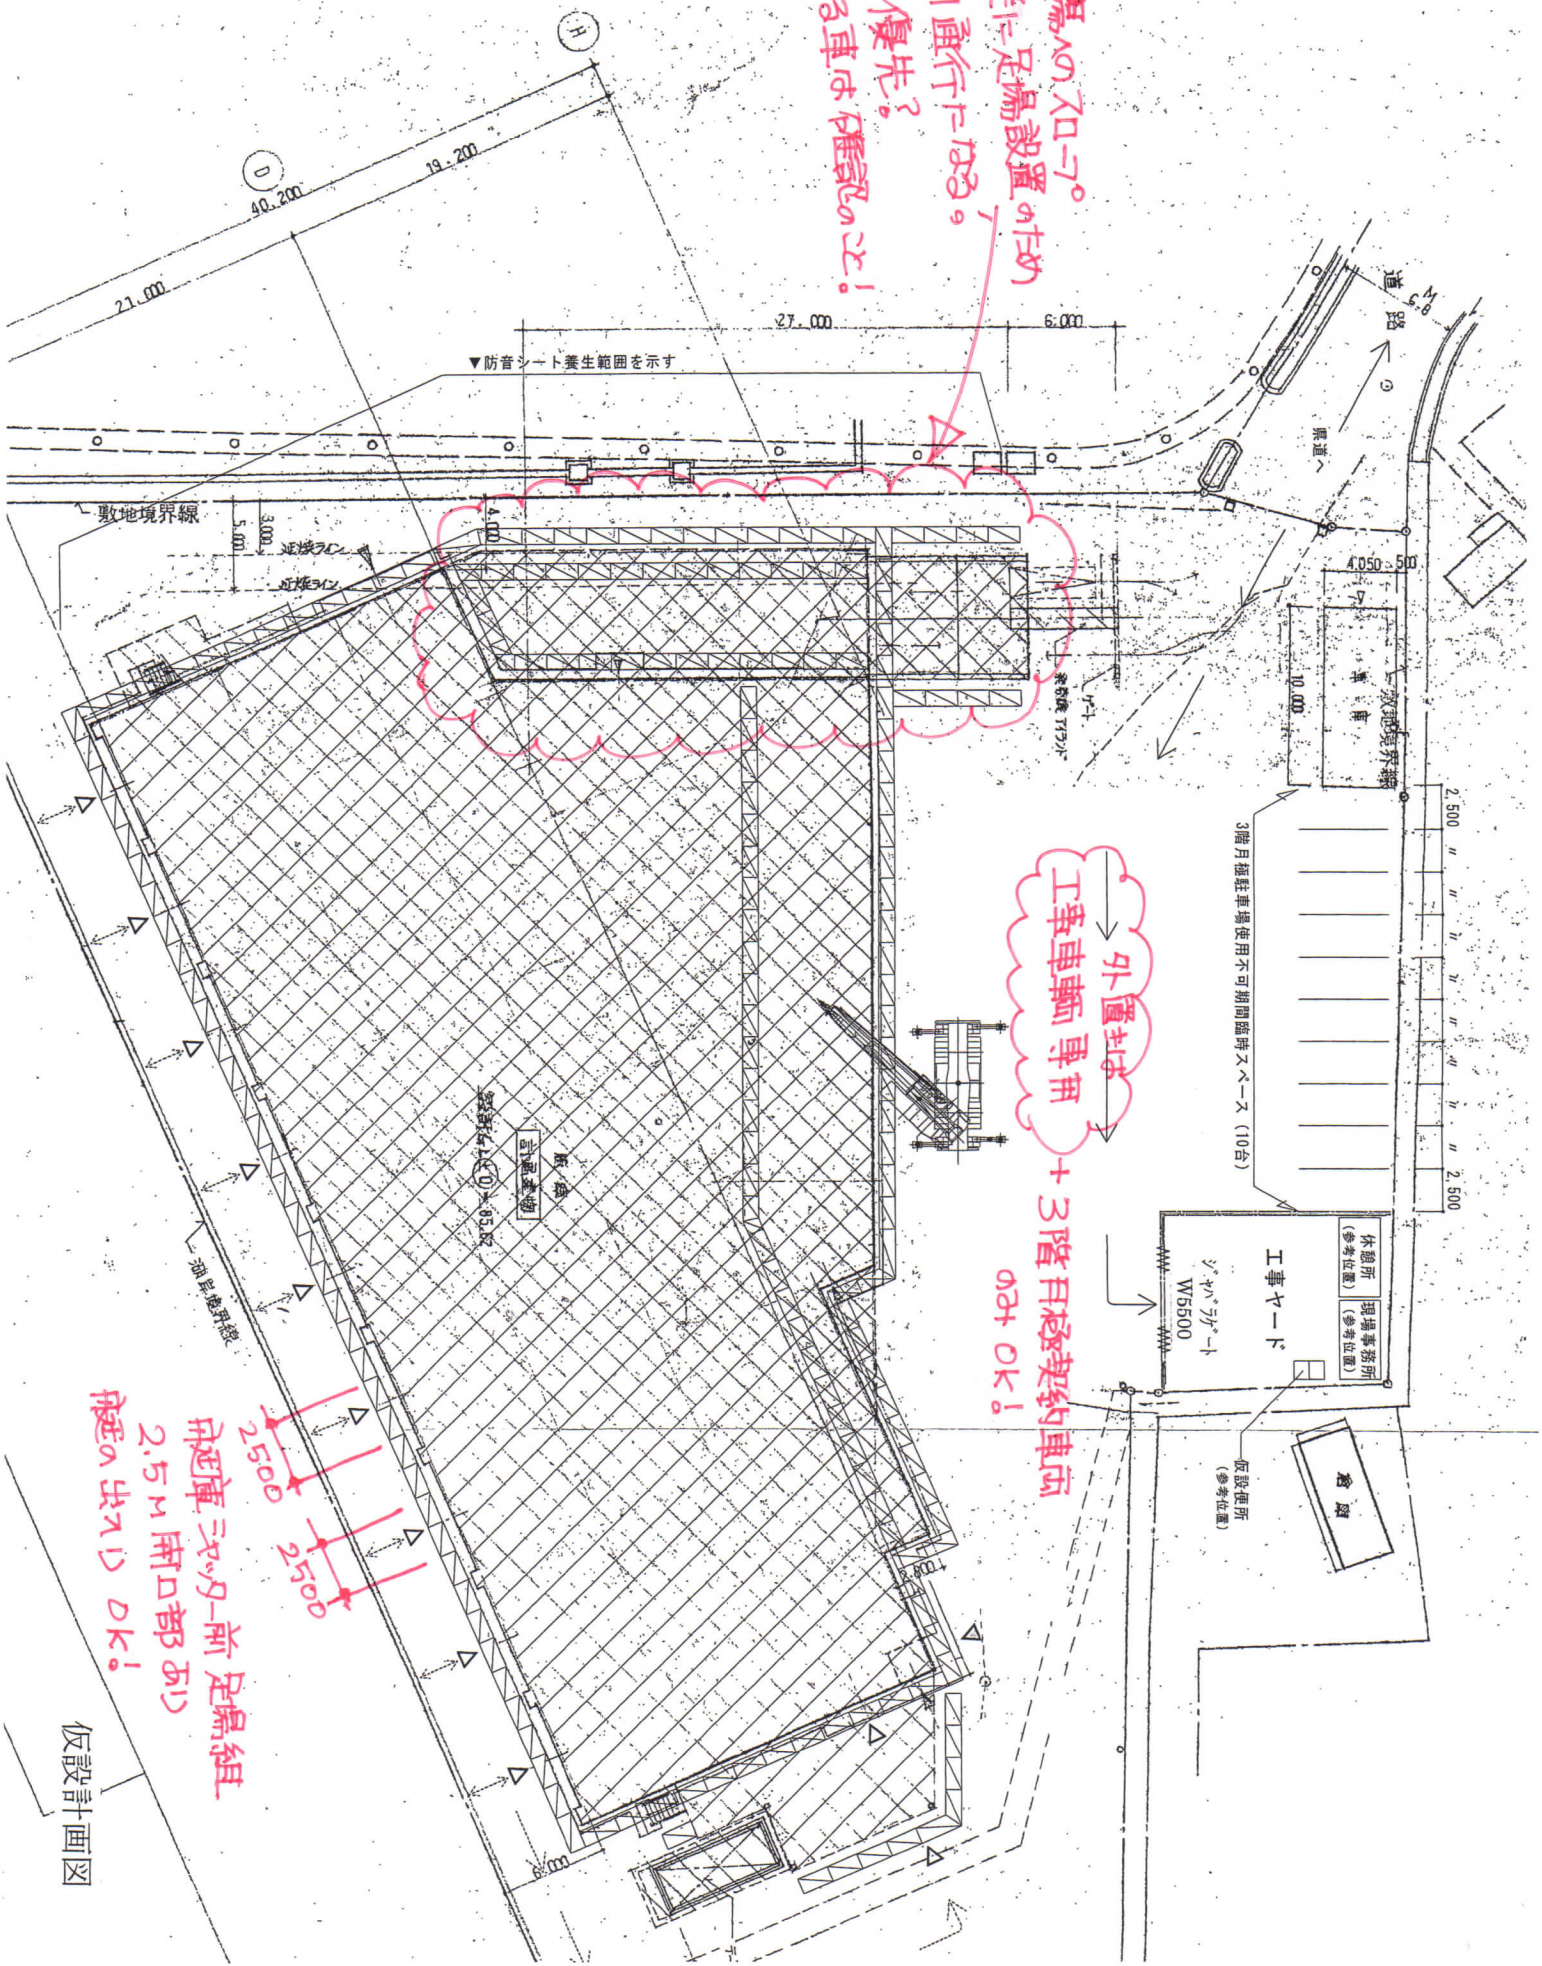

3階床防水工事中は RF階（屋上）へ

3 階仮設計画図

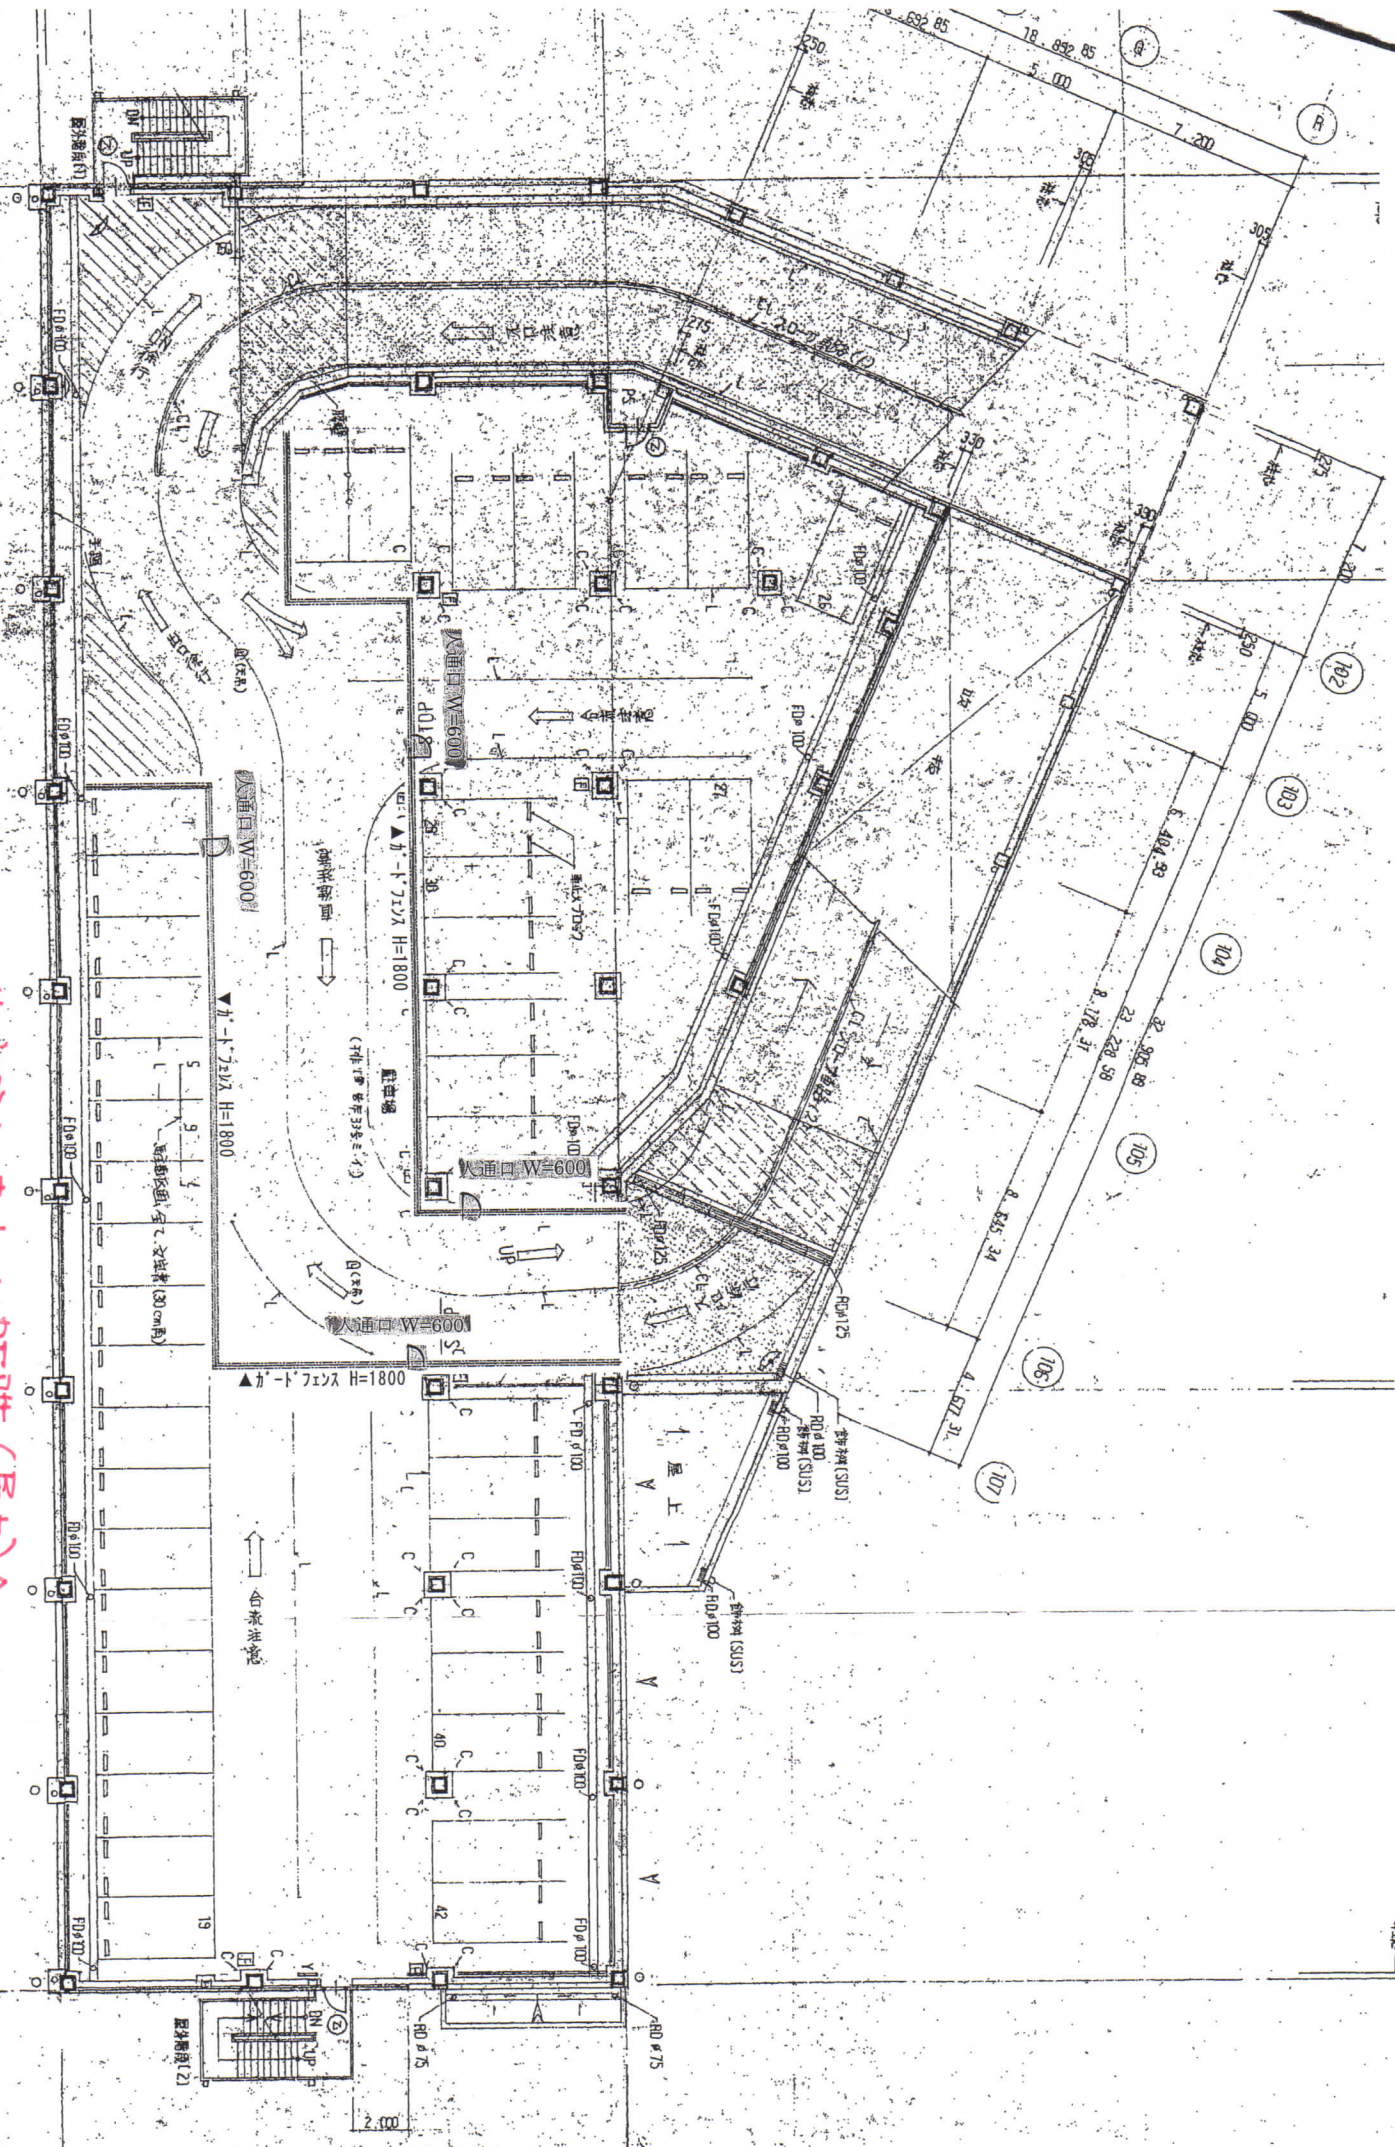

11 月 間 工 程 表

工事名称		令和 3 年度 第 65 号		月間工程		令和 3 年 11 月 1日から 令和 3 年 11 月 30日まで		週休2日促進型 (実施・否 (土曜日・日曜日)		現場代理人		主任技術者																				
日・曜日		月間工程														現場代理人		主任技術者														
工 種		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考
準備・検査	準備																															
共通仮設工事																																
直接仮設工事																																
外壁改修(仕上)																																
外壁改修(解体)																																
防水改修(仕上)																																
防水改修(解体)																																
金属・板金																																
記 事		第 3 回 現場閉所 第 4 回 現場閉所 第 5 回 現場閉所 第 6 回 現場閉所														11/15よりR階駐車不可(1〜3階車路一方通行) 現場閉所																

駐車場：12月未までR1階（屋上）使用不可～3階 26台のみ使用可。
 11/27(土) 28(日) 学芸大会を混むので、よそへ移動予定。

[illegible]

[illegible]

駐車場: 1月中は3階使用不可 ~ R1階(屋上) OK!

表工程間月2

[illegible]

3/24-1 ひとし工事 (2/3 ~ 2/18?)
。土・日は工事なし
。3/24-前 2500 YN OPEN 確保予定。

3 月 間 工 程 表

工 事 名 称															月 間 工 程										週休2日促進型										現場代理人										主任技術者									
令和 3 年度 第 65 号															令和 4 年 3 月 1日から 令和 4 年 3 月 11日まで										(実施) 否 (土曜日・日曜日)										(印)										(印)									
県立柳が崎ヨットハーバー外壁その他長寿命化工事																																																						
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考																					
工 種		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木																						
準備・検査		社内検査		下検査				完了検査																																														
共通仮設工事		仮設材撤去																																																				
		外部仮囲撤去																																																				
直接仮設工事		外部足場撤去																																																				
外壁改修(仕上)																																																						
防水改修(仕上)																																																						
金属・板金																																																						
記 事	現場閉所 現場閉所																																																					

S=1/10 W450 H1820

W 1,820mm

足 180mm

W 450mm



工事中につきご迷惑をお掛けしますが
片側交互通行

にご協力ください

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー

× 4 枚



これより先工事関係車および月極契約車以外
一般車両進入禁止

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー

× 1 枚

赤マーク

赤文字

R3、11、8 (月) メール、FAX

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー 御中 ご担当 山本様 11月13日(土)納品予定

いつもお世話になっております。レオカをお送りしますので校正をお願いいたします。

担当 西岡



株式会社ニシオカ
TEL 077-522-2945(代)
FAX 077-523-5405
